




ANEXO I - DO ETP
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD


“As peças referidas neste anexo, conforme evidenciado no próprio estudo, repousa nos autos, na fase preparatória constante do procedimento”.





ANEXO II DO ETP
OFÍCIO DE DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

"As peças referidas neste anexo, conforme evidenciado no próprio estudo, repousa nos autos, na fase preparatória constante do procedimento".






PREFEITURA DE
HORIZONTE
O TRABALHO CONTINUA



**ANEXO III DO ETP
PEÇAS TÉCNICAS**





QUEIMADAS

02 PLANTA DE LOCAÇÃO E IMPLANTAÇÃO



TERRENO:	4.120,00 m ²
ARENINHA:	1.013,00 m ²
PRAÇA:	3.107,00 m ²

		Prefeitura Municipal de Horizonte	
Documento:	02/12	Data:	01/12/2023
Descrição:	Plan. para Licitação e Implantação de obras	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92
Data:	02/12	Data:	01/12/2023
Valor:	R\$ 1.354.359,92	Valor:	R\$ 1.354.359,92



01 PLANTA BAIXA IMPLANTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO				VALORES DO ADITIVO			
PREFEITURA DE HORIZONTE-CE				UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:				VALOR CONTRATO INICIAL:			
PLANILHA DE ADITIVO Nº 01				CONTRATO: 63.383.384/0001-99				MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:				VALOR ACRESCIDO:			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO PLANALTO DA GALILEIA				2024.04.22.3				DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO				VALOR REDUZIDO:			
RUA JOSÉ MARCELLO DE SOUSA, HORIZONTE - CE				LICITAÇÃO: 2023.12.26.1				RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS				VALOR ADITIVO:			
				ORÇAMENTO CONTRATUAL										VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO			
				QUANTIDADES										VALORES (R\$)			
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO			
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					R\$ 39.133,00				R\$ -	R\$ -	R\$ 39.133,00	R\$ 39.133,00			
1.1		ADMINISTRAÇÃO															
1.1.1	CPM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	R\$ 391,33	R\$ 391,33	R\$ 39.133,00			100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 39.133,00	R\$ 39.133,00			
2		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 77.377,60				R\$ 2.657,14	R\$ -	R\$ 81.772,03	R\$ 80.094,74			
2.1		IDENTIFICAÇÃO															
2.1.1	021837	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	6,00	R\$ 229,07	R\$ 223,88	R\$ 1.343,28			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.376,02	R\$ 1.343,28			
2.1.2	CPM-02	PLACA DE NAUFRAGAÇÃO DE OBRA (70x50)CM. EM AÇO INOX, COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO	UN	0,00	R\$ 2.711,94	R\$ 2.657,14	R\$ -	1,00		1,00	R\$ 2.657,14	R\$ -	R\$ 2.711,64	R\$ 2.657,14			
2.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO															
2.2.1	98225	LIJEZA MECANIZADA DE CAVADA VEGETAL VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM "RATOR DE ESTERAS AF. 05/2018	M2	3126,00	R\$ 0,46	R\$ 0,46	R\$ 1.437,96			3126,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.437,96	R\$ 1.437,96			
2.3		CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO															
2.3.1	00370	BARRAÇÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1	UN	1,00	R\$ 8.524,01	R\$ 8.363,89	R\$ 8.363,89			1,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.524,01	R\$ 8.363,89			
2.4		MOVIMENTO DE TERRA															
2.4.1	02754	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	12,54	R\$ 61,26	R\$ 61,26	R\$ 768,20			12,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 768,20	R\$ 768,20			
2.4.2	02921	REATERRO E/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE	M3	5,89	R\$ 39,29	R\$ 39,29	R\$ 231,42			5,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 231,42	R\$ 231,42			
2.4.3	00528	ATERRO E/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	453,64	R\$ 130,82	R\$ 127,54	R\$ 57.857,35			453,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 60.345,18	R\$ 59.345,18			
2.5		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS															
2.5.1	02940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	223,08	R\$ 13,87	R\$ 13,87	R\$ 3.094,12			223,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.094,12	R\$ 3.094,12			
2.5.2	01066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	126,00	R\$ 33,98	R\$ 33,98	R\$ 4.281,48			126,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.281,48	R\$ 4.281,48			

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
510

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
2206

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO			VALORES DO ADITIVO		
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO	VALOR CONTRATO INICIAL:	VALOR CONTRATO ATUALIZADO	
PLANILHA DE ADITIVO Nº 01				CNPJ:	63.383.384/0001-99	MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		2,01%	783.055,24	783.055,24	783.055,24	783.055,24	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO PLANALTO DA GALILEIA				Nº	2024.04.22.3	DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		1,98%	783.055,24	783.055,24	783.055,24	783.055,24	
RUA JOSÉ MARCELINO DE SOUSA, HORIZONTE - CE				Nº	2023.12.26.1	RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:		-0,03%	783.055,24	783.055,24	783.055,24	783.055,24	
				ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES			VALORES (R\$)				
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
3		INFRAESTRUTURA						R\$ 7.100,70				R\$	R\$	R\$ 7.231,89	R\$ 7.100,70
3.1		FORMAS													
3.1.1	C1394	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X		M2	5,72	R\$ 154,72	R\$ 152,15	R\$ 261,70		1,72		R\$	R\$	R\$ 266,12	R\$ 261,70
3.2		ARMADURAS													
3.2.1	C0216	ARMADURA CA 50A MÉDIA Ø= 6,3 A 10,0mm		KG	53,29	R\$ 14,98	R\$ 14,54	R\$ 780,17		53,29		R\$	R\$	R\$ 798,28	R\$ 780,17
3.3		CONCRETOS													
3.3.1	C0836	CONCRETO MÃO ESTRUTURAL, PREPARO MANUAL		M3	0,65	R\$ 629,72	R\$ 617,81	R\$ 401,58		0,65		R\$	R\$	R\$ 409,32	R\$ 401,58
3.3.2	C0844	CONCRETO P/VIBR. FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	6,15	R\$ 715,71	R\$ 699,30	R\$ 4.300,70		6,15		R\$	R\$	R\$ 4.401,62	R\$ 4.300,70
3.3.3	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO		M3	6,81	R\$ 199,20	R\$ 199,20	R\$ 1.356,55		6,81		R\$	R\$	R\$ 1.356,55	R\$ 1.356,55
4		SUPERESTRUTURAS						R\$ 7.452,21				R\$	R\$	R\$ 7.579,45	R\$ 7.452,21
4.1		FORMAS													
4.1.1	C1396	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL 5X		M2	10,51	R\$ 154,72	R\$ 152,15	R\$ 1.599,10		10,51		R\$	R\$	R\$ 1.626,11	R\$ 1.599,10
4.2		ARMADURAS													
4.2.1	C0217	ARMADURA CA 60 F NA D=140 A 6,40mm		KG	0,74	R\$ 15,14	R\$ 14,78	R\$ 10,94		0,74		R\$	R\$	R\$ 11,20	R\$ 10,94
4.2.2	C0216	ARMADURA CA 30A MÉDIA Ø= 6,3 A 10,0mm		KG	46,70	R\$ 14,98	R\$ 14,54	R\$ 683,69		46,70		R\$	R\$	R\$ 699,57	R\$ 683,69
4.2.3	C0215	ARMADURA CA 50A GROSSA Ø= 12,5 A 25,0mm		KG	58,83	R\$ 16,27	R\$ 15,93	R\$ 937,16		58,83		R\$	R\$	R\$ 957,19	R\$ 937,16
4.3		CONCRETOS													
4.3.1	C0843	CONCRETO P/VIBR. FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO		M3	4,27	R\$ 667,42	R\$ 652,41	R\$ 2.785,79		4,27		R\$	R\$	R\$ 2.849,98	R\$ 2.785,79
4.3.2	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO		M3	4,27	R\$ 336,19	R\$ 336,19	R\$ 1.415,53		4,27		R\$	R\$	R\$ 1.435,53	R\$ 1.415,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
541
2024
2020

EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO				
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$ 783.056,24	VALOR CONTRATO INICIAL:	R\$ 767.336,40			
CNPJ: 63.383.384/0001-99				MÊS:	DEZEMBRO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:	2,01%	VALOR ACRESCIDO:	R\$ 11,85%			
CONTRATO 2024.04.22.3				DATA DA EMISSÃO:	16/12/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	1,98%	VALOR REDUZIDO:	R\$ 32.405,76			
LICITAÇÃO: 2023.12.26.1				RECURSO:	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS	-0,03%	VALOR ADITIVO:	R\$ 58.520,63			
ORÇAMENTO CONTRATUAL				PREÇO TOTAL CONTRATUAL	R\$ 151.107,65	VALOR CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 133.412,51	VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO	R\$ 825.857,03			
QUANTIDADES				QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR ACRESCIDO	VALOR REDUZIDO	VALOR ATUALIZADO			
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR ACRESCIDO	VALOR REDUZIDO	VALOR ATUALIZADO
VALORES (R\$)												
5		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
5.1		QUADROS E ACESSÓRIOS										
5.1.1	C14-405	PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COM LENTE PARA LETURA À DISTÂNCIA. QUADRO DE PROTEÇÃO. PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 1.385,04	R\$ 1.344,88			1,00	R\$	R\$ 1.385,04	R\$ 1.344,88
5.1.2	C14-406	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPORTE EM PONTE, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES DIN. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 411,32	R\$ 399,73			1,00	R\$	R\$ 411,32	R\$ 399,73
5.1.3	C14-407	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (1,4")	PAR	1,00	R\$ 2,15	R\$ 2,10			1,00	R\$	R\$ 2,15	R\$ 2,10
5.1.4	C14-408	BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 50mm (2")	PAR	4,00	R\$ 8,36	R\$ 8,20			4,00	R\$	R\$ 33,44	R\$ 32,80
5.1.5	C14-409	TERMINAL OLHA PARA CABO DE 1,50MM² A 2,50MM²	UN	16,00	R\$ 10,82	R\$ 10,64	4,00		20,00	R\$	R\$ 216,40	R\$ 212,80
5.1.6	C14-410	TERMINAL OLHA PARA CABO DE 4,00MM² A 6,00MM²	UN	20,00	R\$ 10,82	R\$ 10,64	4,00		24,00	R\$	R\$ 259,68	R\$ 255,36
5.2		CAIXAS E ACESSÓRIOS										
5.2.1	C14-407	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINARIA 30x30x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 307,13	R\$ 303,82			1,00	R\$	R\$ 307,13	R\$ 303,82
5.2.2	C14-408	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	24,00	R\$ 457,03	R\$ 452,61		1,00	23,00	R\$	R\$ 452,61	R\$ 450,69
5.2.3	C14-409	CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINARIA 60x60x80 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 808,90	R\$ 802,27			1,00	R\$	R\$ 808,90	R\$ 804,40
5.2.4	C14-410	PETROLET ALUMÍNIO DE 1/2" TIPO T, X=1	UN	20,00	R\$ 23,62	R\$ 23,22			20,00	R\$	R\$ 348,81	R\$ 344,40
5.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS										
5.3.1	C14-411	ELETRODUTO PVC RIGÍD. INC. CONEXÕES D= 20mm (1/2")	M	30,00	R\$ 21,30	R\$ 21,24	16,50		46,50	R\$	R\$ 348,81	R\$ 343,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
542

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
2208



CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO PLANALTO DA GALILEIA

RUA JOSÉ NARCÉLIO DE SOUSA, HORIZONTE - CE

EMPRESA CONTRATADA:										DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO				
UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA										ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$	783.056,24	VALOR CONTRATO INICIAL:	R\$	767.336,40	
CNPJ: 63.383.384/0001-99										MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		VALOR ACRESCIDO		R\$		90.926,39
CONTRATO: 2024.04.22.3										DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		VALOR REDUZIDO		R\$		32.405,76
LICITAÇÃO: 2023.12.26.1										RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:		VALOR ADITIVADO		R\$		58.520,63
ORÇAMENTO CONTRATUAL										QUANTIDADES		VALORES (R\$)		VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO		R\$		825.857,03
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO				
5.3.2	01136	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	3,57	R\$ 22,54	R\$ 22,35	R\$ 79,79	0,13		3,70	R\$ 2,91	R\$	R\$ 83,40	R\$ 82,70				
5.3.3	03618	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) D=1,12", INCLUSIVE CONEXÕES	V	294,26	R\$ 38,17	R\$ 38,77	R\$ 11.563,54		1,30	296,96	R\$	R\$ 50,40	R\$ 11.572,53	R\$ 11.513,14				
5.3.4	01194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 62mm (2")	M	52,40	R\$ 61,43	R\$ 60,69	R\$ 3.180,15		43,63	8,77	R\$	R\$ 2.647,91	R\$ 538,74	R\$ 532,25				
5.3.5	00466	BRACADEIRA TIPO "B", METÁLICA ATÉ 1"	UN	30,00	R\$ 8,38	R\$ 8,92	R\$ 267,60			30,00	R\$	R\$	R\$ 269,40	R\$ 267,60				
5.3.6	02547	TUBO AÇO GALV. (ZOU S/GOST) INCL. CONEXÕES D= 40mm (1 1/2")	M	0,00	R\$ 143,74	R\$ 140,45	R\$	3,77		3,77	R\$	R\$ 604,90	R\$ 617,30	R\$ 604,90				
5.3.7	02513	TUBO AÇO GALV. (ZOU S/GOST) INCL. CONEXÕES D= 65mm (2 1/2")	M	0,00	R\$ 255,25	R\$ 250,12	R\$	1,84		1,84	R\$	R\$ 460,22	R\$ 469,66	R\$ 460,22				
5.3.8	01157	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 32mm (1")	M	0,00	R\$ 34,71	R\$ 33,12	R\$	7,85		7,85	R\$	R\$ 263,13	R\$ 268,55	R\$ 263,13				
5.3.9	03618	DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) D=2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	0,00	R\$ 47,11	R\$ 46,26	R\$	47,15		47,15	R\$	R\$ 2.181,16	R\$ 2.225,95	R\$ 2.181,16				
5.4		CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS																
5.4.1	00540	CABO ISOLADO PVC 750V 25MM²	M	171,42	R\$ 8,05	R\$ 8,57	R\$ 1.460,07		168,91	2,51	R\$	R\$ 1.447,56	R\$ 21,71	R\$ 21,51				
5.4.2	00554	CABO EM PVC 1000V 4MM²	M	1260,71	R\$ 10,86	R\$ 10,72	R\$ 13.514,81		204,85	1055,76	R\$	R\$ 2.197,06	R\$ 11.465,55	R\$ 11.217,75				
5.4.3	00516	CABO EM PVC 1000V 6MM²	M	12,38	R\$ 15,00	R\$ 12,80	R\$ 158,46	13,01		25,39	R\$	R\$ 195,53	R\$ 330,07	R\$ 324,90				
5.4.4	00516	CABO COREPLAST (CABO PR) 3 x 2,50 mm²	M	220,00	R\$ 12,27	R\$ 12,07	R\$ 2.655,40	21,40		241,40	R\$	R\$ 258,30	R\$ 2.961,98	R\$ 2.763,70				
5.4.5	04933	HAUTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2,40M	UN	24,00	R\$ 160,41	R\$ 158,30	R\$ 3.799,20		2,00	22,00	R\$	R\$ 315,60	R\$ 3.529,02	R\$ 3.500,50				
5.4.6	03811	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO K2C 17-10mm BURDY	UN	24,00	R\$ 16,49	R\$ 16,07	R\$ 385,68		2,00	22,00	R\$	R\$ 32,14	R\$ 369,78	R\$ 363,78				
5.4.7	04377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	M	0,00	R\$ 8,98	R\$ 8,80	R\$	476,99		476,99	R\$	R\$ 4.197,51	R\$ 4.273,31	R\$ 4.273,31				
5.5		MOVIMENTO DE TERRA																
5.5.1	02784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLDO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50M	M3	52,30	R\$ 61,26	R\$ 61,26	R\$ 3.203,90	5,02		57,32	R\$	R\$ 307,52	R\$ 3.511,42	R\$ 3.511,42				
5.5.2	02921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE MATERIAL DA VALA	M3	52,30	R\$ 39,29	R\$ 39,29	R\$ 2.054,87	5,02		57,32	R\$	R\$ 197,23	R\$ 2.252,10	R\$ 2.252,10				
5.6		DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS																
5.6.1	01093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	16,00	R\$ 30,14	R\$ 29,70	R\$ 475,20			16,00	R\$	R\$	R\$ 482,24	R\$ 475,20				

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			EMPRESA CONTRATADA:			DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO			VALORES DO ADITIVO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA			ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:			VALOR CONTRATO INICIAL:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			CNPJ: 63.383.384/0001-99			MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:			VALOR ACRESCIDO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			CONTRATO: 2024.04.22-3			DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO			VALOR REDUZIDO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			LICITAÇÃO: 2023.12.26.1			RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:			VALOR ADITIVADO:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			ORÇAMENTO CONTRATUAL			QUANTIDADES			VALORES (R\$)			VALORES DO ADITIVO		
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
5.6.2	01222	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 75A	UN	2,00	R\$ 124,04	R\$ 121,68	R\$ 243,36			2,00	R\$	R\$	R\$ 248,08	R\$ 243,36
5.6.3	04562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO DPS 40 KA/40KV	UN	8,00	R\$ 167,58	R\$ 162,30	R\$ 1.298,40		4,00	4,00	R\$	R\$ 649,20	R\$ 670,32	R\$ 649,20
5.7		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS												
5.7.1	CPM-H10	LUMINÁRIA COM TECNOLOGIA LED DE 100 W, BIVOLT, 50 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000 K A 6.000 K, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, FLUXO LUMINOSO MÍNIMO 12.000 LM, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 120 LM/W, IRC > 70, IP 66, INTEGRAL, 1x108, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, VIDA ÚTIL 50.000 HORAS @ 70, GARANTIA DE 03 ANOS, COM CERTIFICAÇÃO PORTÁTIL 2019METRIC E ARQUIVO: ES, INCLUINDO BASE E RELE FOTOELÉTRICO 1.000W/220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	25,00	R\$ 1.551,79	R\$ 1.506,41	R\$ 43.685,89		8,00	21,00	R\$	R\$ 12.051,28	R\$ 32.587,59	R\$ 31.634,61
5.7.2	CPM-H12	LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	UN	1,00	R\$ 272,02	R\$ 266,00	R\$ 266,00			1,00	R\$	R\$	R\$ 272,02	R\$ 266,00
5.7.3	CPM-H13	ARANDELA COM SOQUETE E-27, CORPO E GRADE FRONTAL DE PROTEÇÃO EM ALUMÍNIO, DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE COM LÂMINA JAPUADA ELETRÔNICA FLUORESCENTE COMPACTA DE 15W, COMPLETA	UN	20,00	R\$ 136,75	R\$ 134,49	R\$ 2.689,80			20,00	R\$	R\$	R\$ 2.735,58	R\$ 2.689,80
5.7.4	CPM-H12	PROJETOR COM TECNOLOGIA LED DE 200 W, BIVOLT, 60 HZ, TEMPERATURA DE COR 5.000K, FATOR DE POTÊNCIA > 0,92, EFICIÊNCIA LUMINOSA MÍNIMA 90 LM/W, IRC > 70, IP 66, INTEGRAL, CORPO EM ALUMÍNIO INJETADO, INCLUINDO BASE E RELE FOTOELÉTRICO 1.000W/220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	R\$ 426,62	R\$ 414,85	R\$ 4.978,20			12,00	R\$	R\$	R\$ 5.119,44	R\$ 4.978,20
5.7.5	CPM-H13	SUPOORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/10 PARA Q1 LUMINÁRIA TIPO PÉTALA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	R\$ 158,21	R\$ 155,34	R\$ 4.504,86		15,00	14,00	R\$	R\$ 2.330,10	R\$ 2.374,76	R\$ 2.374,76
5.7.6	CPM-H14	SUPOORTE METÁLICO EM AÇO GALVANIZADO INSTALADO EM TOPO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 200/10 PARA Q2 LUMINÁRIAS TIPO PÉTALA, COM ÂNGULO DE 90° FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	R\$ 173,25	R\$ 169,80	R\$ 1.019,40		4,00	2,00	R\$	R\$ 679,60	R\$ 819,80	R\$ 819,80
5.7.7	101632	RELE FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2020	UN	0,00	R\$ 52,43	R\$ 51,28	R\$	2,00		2,00	R\$	R\$ 103,56	R\$ 104,66	R\$ 102,56



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTI-CE				EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO	
PLANTILHA DE ADITIVO Nº 01				UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:		VALOR CONTRATO INICIAL:	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO PLANALTO DA GALILEIA				CONTRATO: 2024.04.22.3				MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		VALOR ACRESCIDO	
RUA JOSÉ MARCELLO DE SOUSA, HORIZONTE - CE				LICITAÇÃO: 2023.12.26.1				DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		VALOR REDUZIDO	
								RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:		VALOR ADITIVADO	
												VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	
												R\$ 825.857,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO			
PLANO DE ADITIVO Nº 01				UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:		VALOR CONTRATO INICIAL:			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO PLANALTO DA GALILEIA				CNPJ: 63.383.384/0001-99				MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		VALOR ACRESCIDO			
				CONTRATO: 2024.04.22.3				DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		VALOR REDUZIDO			
				LICITAÇÃO: 2023.12.26.1				RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:		VALOR ADITIVADO			
RUA JOSÉ NARCÉLIO DE SOUSA, HORIZONTE - CE				ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES (R\$)			
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
6.2.6	04071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q.92		M2	442,13	R\$ 15,15	R\$ 14,73	R\$ 6.512,57			442,13	R\$	R\$	R\$ 6.606,27	R\$ 6.512,57
PISO EMBOBRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)															
6.2.7	04033			M2	93,96	R\$ 355,78	R\$ 344,57	R\$ 32.375,80			93,96	R\$	R\$	R\$ 33.429,09	R\$ 32.375,80
MEIO FIO															
6.3															
6.3.1	05445	MEIO FIO PARE MOLCADO (COTAO 30x1,00cm) CIRE LANTAMENTO		M	710,86	R\$ 34,42	R\$ 33,77	R\$ 24.359,67			710,86	R\$	R\$	R\$ 24.779,58	R\$ 24.359,67
6.3.2	00266	BANQUETA, MEIO FIO DE CONCRETO P/VAZ URBANAS (1,00x0,15x0,15m)		M	326,13	R\$ 76,94	R\$ 76,43	R\$ 27.211,89			326,13	R\$	R\$	R\$ 27.400,64	R\$ 27.211,89
DRENAGEM															
6.4.1	02593	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40x40x60 cm, LASTRO DE BR.TA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		UN	0,00	R\$ 457,03	R\$ 452,63	R\$	9,00		9,00	R\$ 4.073,49	R\$	R\$ 4.113,27	R\$ 4.073,49
6.4.2	02593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')		M	0,00	R\$ 52,77	R\$ 51,71	R\$	54,00		54,00	R\$ 2.792,34	R\$	R\$ 2.849,58	R\$ 2.792,34
6.4.3	02600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6')		M	0,00	R\$ 84,29	R\$ 82,50	R\$	73,45		73,45	R\$ 6.066,97	R\$	R\$ 6.191,10	R\$ 6.066,97
7		ESQUADRIAS						R\$ 55.240,95				R\$ 56.871,69	R\$	R\$ 113.279,62	R\$ 112.112,64
7.1		METÁLICAS													
7.1.1	02545	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" INCLUSIVE PINTURA, M2		M2	196,58	R\$ 281,00	R\$ 281,01	R\$ 55.240,95			196,58	R\$	R\$	R\$ 55.240,95	
7.1.2	02547	ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" E TELA DE NYLON HD ESP=3MM E MALHA DE 15 X 51CM, INCLUSIVE PINTURA, M2		M2	0,00	R\$ 37,23	R\$ 36,48	R\$	1.391,06		1.391,06	R\$ 50.745,87	R\$	R\$ 51.136,93	
7.1.3	02548	SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE TELA METÁLICA DE ALAMBRADO, INCLUINDO ESTICAMENTO E FIXAÇÃO ADEQUADOS		M2	0,00	R\$ 104,47	R\$ 102,37	R\$	59,84		59,84	R\$ 6.125,82	R\$	R\$ 6.185,64	
8		PINTURA						R\$ 23.308,79				R\$ 6.389,41	R\$	R\$ 29.918,52	
8.1		PAREDE													



PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			EMPRESA CONTRATADA:			DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO			VALORES DO ADITIVO			
PLANO DE ADITIVO Nº 01			UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA			ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:			VALOR CONTRATO INICIAL:			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO PLANALTO DA GALILEIA			63.383.384/0001-99			MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:			VALOR ACRESCIDO:			
RUA JOSÉ MARCELINO DE SOUSA, HORIZONTE - CE			2024.04.22.3			DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO			VALOR REDUZIDO:			
			2023.12.26.1			RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:			VALOR ADITIVADO			
											VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R\$ 825.857,03			
ITEM	CÓD	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	ORÇAMENTO CONTRATUAL					VALORES (R\$)						
			UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
8.1.1	C1461	TEXTURA ACRILICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	69,00	R\$ 17,29	R\$ 17,19	R\$ 1.186,11	283,58		362,58	R\$ 4.874,74	R\$	R\$ 6.096,11	R\$ 6.000,85
8.1.2	C1207	EVASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRILICA	M2	10,75	R\$ 20,35	R\$ 20,22	R\$ 217,37	15,05		25,80	R\$ 304,31	R\$	R\$ 525,03	R\$ 521,68
8.1.3	C1614	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	10,75	R\$ 28,61	R\$ 28,35	R\$ 304,76	28,16		38,91	R\$ 798,34	R\$	R\$ 1.113,22	R\$ 1.103,10
8.2		PISO												
8.2.1	C1910	PINTURA FIMPO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR"	M2	679,69	R\$ 31,02	R\$ 31,78	R\$ 21.500,55			679,69	R\$	R\$	R\$ 21.763,67	R\$ 21.500,55
8.3		SUPERFÍCIE METÁLICA												
8.3.1	C1075	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	0,00	R\$ 55,82	R\$ 54,50	R\$	7,56		7,56	R\$ 412,02	R\$	R\$ 420,49	R\$ 42,02
9		URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO					R\$ 105.333,19				R\$	R\$	R\$ 108.084,75	R\$ 105.333,19
9.1		URBANIZAÇÃO												
9.1.1	C1440	BANCO EM "U" 3" ENCOSTO PADRÃO	M	60,00	R\$ 424,16	R\$ 415,94	R\$ 24.956,40			60,00	R\$	R\$	R\$ 25.443,60	R\$ 24.766,40
9.1.2	CPV-602	B/C CLETAR O EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" C/6 ARCOS INCLUSIVE PINTURA ESMALT. UND	UND	5,00	R\$ 2.547,60	R\$ 2.467,35	R\$ 12.336,75			5,00	R\$	R\$	R\$ 12.738,00	R\$ 12.336,75
9.1.3	CPV-603	PERGOLADO EM MADEIRA MACAARANDUBA, DIMENSÕES CONFORME PROJETO, PEÇAS COM DIMENSÕES 0,15 X 0,07 (PILAR, VIGA E COBERTAL, INCLUSIVE PINTURA COM SELADOR E VERNIZ 3 DEMÃOS. UND	UND	1,00	R\$ 7.174,68	R\$ 6.948,88	R\$ 34.743,40			5,00	R\$	R\$	R\$ 35.874,92	R\$ 34.743,40
9.1.4	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", 4" = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	CJ	1,00	R\$ 3.384,90	R\$ 3.278,27	R\$ 3.278,27			1,00	R\$	R\$	R\$ 3.278,27	R\$ 3.278,27
9.1.5	CPV-604	LIXEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO CIRCULAR COM DIÂMETRO DE 0,40m, INCLUSIVE PINTURA TIPO NOVACOR. UND	UND	10,00	R\$ 235,06	R\$ 228,53	R\$ 2.285,30			10,00	R\$	R\$	R\$ 2.359,30	R\$ 2.285,30
9.2		PAISAGISMO												
9.2.1	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	M2	328,09	R\$ 23,35	R\$ 22,75	R\$ 7.467,33			328,09	R\$	R\$	R\$ 7.580,90	R\$ 7.467,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
527

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				PREFEITURA DE HORIZONTE-CE				EMPRESA CONTRATADA				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO				VALORES DO ADITIVO			
PLANILHA DE ADITIVO Nº 01				UNO INCORPORAÇÕES LIMITADA				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:		R\$ 783.056,24		VALOR CONTRATO INICIAL:		R\$ 767.336,40					
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA ENTORNO DA ARENINHA TIPO II DO BAIRRO PLANALTO DA GALILEIA				CNPJ: 63.383.384/0001-99		MÊS: DEZEMBRO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:		2,01%		VALOR ACRESCIDO:		R\$ 11,85%							
RUA JOSE NARCÉLIO DE SOUSA, HORIZONTE - CE				CONTRATO: 2024.04.22.3		DATA DA EMISSÃO: 16/12/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO		1,98%		VALOR REDUZIDO:		R\$ 32.405,76							
				LICITAÇÃO: 2023.12.26.1		RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:		-0,03%		VALOR ADITIVO:		R\$ 58.520,63							
				ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES				VALORES (R\$)									
ITEM	COD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERENCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO						
9.2.2	585.11	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AT 05/2018		UN	25,00	R\$ 276,54	R\$ 268,78	R\$ 6.719,50			25,00	R\$	R\$ 6.719,50	R\$ 6.719,50	R\$ 6.719,50						
9.2.3	585.15	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AT 05/2018		UN	17,00	R\$ 555,78	R\$ 556,45	R\$ 9.459,65			17,00	R\$	R\$ 9.459,65	R\$ 9.459,65	R\$ 9.459,65						
9.3		LIMPEZA FINAL																			
9.3.1	734.47	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA		M2	2362,19	R\$ 1,73	R\$ 1,73	R\$ 4.086,59			2362,19	R\$	R\$ 4.086,59	R\$ 4.086,59	R\$ 4.086,59						
TOTAL GERAL:																					
								R\$ 767.336,40					R\$ 90.926,39	R\$ 32.405,76	R\$ 842.512,69	R\$ 825.857,03					

TOTAL ADITIVO:

(cinquenta e oito mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e três centavos)

	SERVIÇOS INCLUIDOS NO ADITIVO
	SERVIÇOS COM QUANTIDADES ACRESCIDAS
	SERVIÇOS COM QUANTIDADES REDUZIDAS

Daniel Wylame
Engenheiro Civil - RNP 06197855-9
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE

Ricardo Dantas Sampaio
Secretário de Infraestrutura, Urbanismo
e Recursos Hídricos
Agropecuária e Recursos Hídricos
CPF 351.726.383-00
Portaria Nº 011/2025





CORREÇÃO MONETÁRIA

INCC-M

Valor inicial
\$ 1,00

Data inicial
30/11/2023

Data final
15/09/2025

Valor corrigido
\$ 1,12



Índice de correção no período: 1,121276
Valor percentual correspondente: 12,191276 %

Detalhes do cálculo mês a mês

Nº	Ref.	Valor Inicial	INCC-M (%)	Valor Correção	Valor Corrigido
1	11/2023	1,00	0,10	0,00	1,00
2	12/2023	1,00	0,26	0,00	1,00
3	01/2024	1,00	0,23	0,00	1,01
4	02/2024	1,01	0,20	0,00	1,01
5	03/2024	1,01	0,24	0,00	1,01
6	04/2024	1,01	0,41	0,00	1,01
7	05/2024	1,01	0,59	0,01	1,02
8	06/2024	1,02	0,93	0,01	1,03
9	07/2024	1,03	0,69	0,01	1,04
10	08/2024	1,04	0,64	0,01	1,04
11	09/2024	1,04	0,61	0,01	1,05
12	10/2024	1,05	0,67	0,01	1,06
13	11/2024	1,06	0,44	0,00	1,06
14	12/2024	1,06	0,51	0,01	1,07
15	01/2025	1,07	0,71	0,01	1,07
16	02/2025	1,07	0,51	0,01	1,08
17	03/2025	1,08	0,38	0,00	1,08



Nº	Ref.	Valor Inicial	INCC-M (%)	Valor Correção	Valor Corrigido
18	04/2025	1,08	0,59	0,01	1,09
19	05/2025	1,09	0,26	0,00	1,09
20	06/2025	1,09	0,96	0,01	1,10
21	07/2025	1,10	0,91	0,01	1,11
22	08/2025	1,11	0,70	0,01	1,12

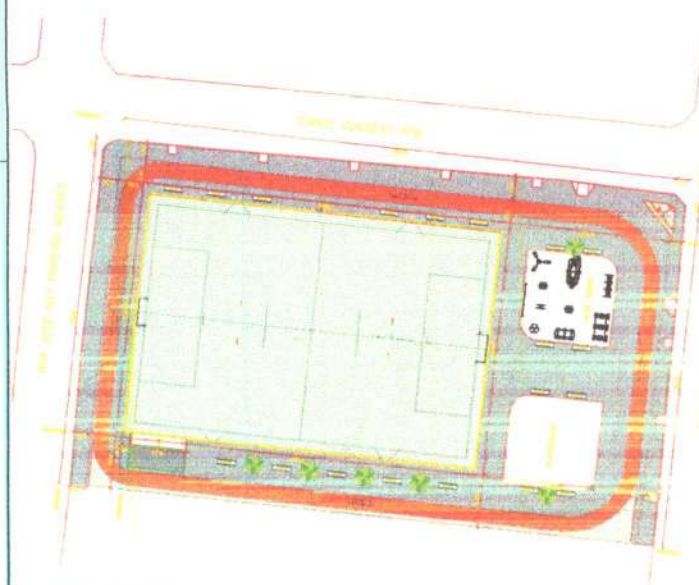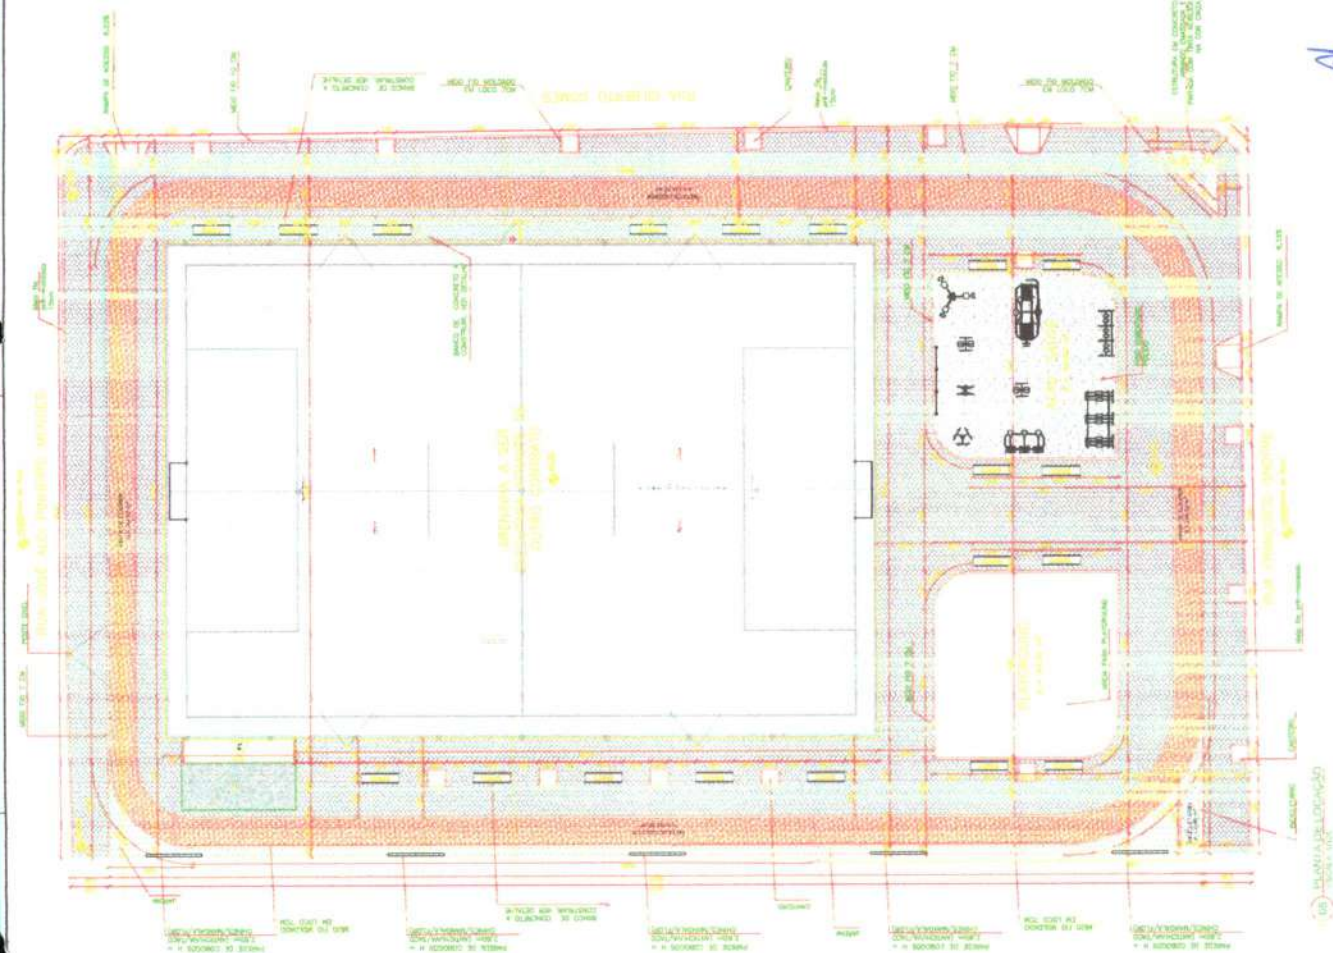

04) DET. PIÙ CINQUANTO
CASA 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				EMPRESA CONTRATADADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO			VALORES DO ADITIVO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE				WERCOR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA — ME				ADITIVO Nº: 1		VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:			VALOR CONTRATO INICIAL:			
PLANO DE ADITIVO Nº 01				CNPJ: 14.781.255/0001-43				MÊS: MAIO		PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:			VALOR ACRESCIDO:			
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO DIADEMA.				CONTRATO: 2023.12.19.1				DATA DA EMISSÃO: 20/05/2024		PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO			VALOR REDUZIDO:			
RUA FRANCISCO ONOFRE, S/N, DIADEMA, HORIZONTE - CE				LICITAÇÃO: 2023.02.07.1				RECURSO: PMH		DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:			VALOR ADITIVO:			
				ORÇAMENTO CONTRATUAL							VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:			R\$ 386.035,02		
				QUANTIDADES							VALORES (R\$)					
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS		UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	
1		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						R\$ 22.383,00				R\$ -	R\$ -	R\$ 26.348,00	R\$ 22.383,00	
1.1		ADMINISTRAÇÃO														
1.1.1	CPM-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA		%	100,00	R\$ 263,48	R\$ 223,83	R\$ 22.383,00			100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 26.348,00	R\$ 22.383,00	
2		SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 56.116,77				R\$ -	R\$ -	R\$ 66.071,45	R\$ 56.116,77	
2.1		CANTEIRO DE OBRA														
2.1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA		M2	6,00	R\$ 189,57	R\$ 161,12	R\$ 966,72			6,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.138,02	R\$ 966,72	
2.1.2	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA AF. 05/2018		M2	277,20	R\$ 149,37	R\$ 126,30	R\$ 35.176,68			277,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.405,36	R\$ 35.176,68	
2.2		PREPARAÇÃO DO TERRENO														
2.2.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COMITADOR DE ESTERAS AF. 05/2018		M2	2.424,43	R\$ 0,43	R\$ 0,36	R\$ 877,79			2.424,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.042,50	R\$ 872,79	
2.3		MOVIMENTO DE TERRA														
2.3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m		M3	9,70	R\$ 51,60	R\$ 43,84	R\$ 425,25			9,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 500,53	R\$ 425,25	
2.3.2	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO		M3	196,19	R\$ 112,06	R\$ 95,19	R\$ 18.675,33			196,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.985,33	R\$ 18.675,33	
3		INFRAESTRUTURA						R\$ 3.889,57				R\$ -	R\$ -	R\$ 4.577,89	R\$ 3.889,57	
3.1		EMBASAMENTOS E BALDRAMES														
3.1.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4		M3	1,52	R\$ 766,35	R\$ 651,01	R\$ 989,54			1,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.165,85	R\$ 989,54	
3.1.2	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²		M2	19,00	R\$ 39,33	R\$ 33,41	R\$ 534,79			19,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 742,20	R\$ 634,79	
3.2		FORMAS														
3.2.1	C1599	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X		M2	1,72	R\$ 120,10	R\$ 102,03	R\$ 175,49			1,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,57	R\$ 175,49	

552
 PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
 1198
 4.577,89 R\$
 21.985,33 R\$
 206,57 R\$
 175,49 R\$

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO DIADEMA.

RUA FRANCISCO ONOFRE, S/N, DIADEMA, HORIZONTE - CE

EMPRESA CONTRATADA:										DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO	
WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME										ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$ 369.390,25	VALOR CONTRATO INICIAL:	R\$ 313.772,65
CNPJ: 14.781.255/0001-43										MÊS:	MAIO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:	15,06%	VALOR ACRESCIDO	R\$ 78.002,88
CONTRATO: 2023.12.19.1										DATA DA EMISSÃO:	20/05/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	15,06%	VALOR REDUZIDO:	R\$ 5.740,51
LICITAÇÃO: 2023.02.07.1										RECURSO:	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:	0,00%	VALOR ADITIVO:	R\$ 72.262,37
ORÇAMENTO CONTRATUAL										QUANTIDADES		VALORES (R\$)			
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO	
3.3		ARMADURAS													
3.3.1	C0216	ARMADURA CA 50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	53,29	R\$ 17,69	R\$ 15,04	R\$ 801,48		53,29		R\$	R\$	R\$ 942,70	R\$ 801,48	
3.4		CONCRETOS													
3.4.1	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	0,25	R\$ 506,89	R\$ 430,61	R\$ 107,65		0,25		R\$	R\$	R\$ 126,72	R\$ 107,65	
3.4.2	C0843	CONCRETO P/V BR., FCX 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	0,28	R\$ 533,94	R\$ 453,58	R\$ 127,00		0,28		R\$	R\$	R\$ 149,50	R\$ 127,00	
3.4.3	C0844	CONCRETO P/V BR., FCX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,61	R\$ 572,14	R\$ 486,04	R\$ 782,52		1,61		R\$	R\$	R\$ 921,15	R\$ 782,52	
3.4.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	M3	1,89	R\$ 168,85	R\$ 143,44	R\$ 271,10		1,89		R\$	R\$	R\$ 319,13	R\$ 271,10	
4		SUPERESTRUTURAS					R\$ 7.052,29				R\$	R\$	R\$ 8.299,51	R\$ 7.052,29	
4.1		FORMAS													
4.1.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP = 12mm UTIL. 5X	M2	29,31	R\$ 120,10	R\$ 102,03	R\$ 2.990,50		29,31		R\$	R\$	R\$ 3.520,13	R\$ 2.990,50	
4.2		ARMADURAS													
4.2.1	C0217	ARMADURA CA 60 FNA D=3,40 A 6,40mm	KG	7,31	R\$ 15,46	R\$ 13,14	R\$ 96,05		7,31		R\$	R\$	R\$ 113,01	R\$ 96,05	
4.2.2	C0216	ARMADURA CA 50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	116,70	R\$ 17,59	R\$ 15,04	R\$ 1.755,17		116,70		R\$	R\$	R\$ 2.064,42	R\$ 1.755,17	
4.2.3	C0215	ARMADURA CA 50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	KG	58,74	R\$ 18,76	R\$ 15,94	R\$ 936,32		58,74		R\$	R\$	R\$ 1.101,96	R\$ 936,32	
4.3		CONCRETOS													
4.3.1	C0843	CONCRETO P/V BR., FCX 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,09	R\$ 533,94	R\$ 453,58	R\$ 494,40		1,09		R\$	R\$	R\$ 581,69	R\$ 494,40	
4.3.2	C0844	CONCRETO P/V BR., FCX 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	1,06	R\$ 572,14	R\$ 486,04	R\$ 515,20		1,06		R\$	R\$	R\$ 606,41	R\$ 515,20	
4.3.3	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVACÃO	M3	1,09	R\$ 285,81	R\$ 242,80	R\$ 264,65		1,09		R\$	R\$	R\$ 301,53	R\$ 264,65	
5		REVESTIMENTOS					R\$ 7.257,03				R\$	R\$	R\$ 8.542,91	R\$ 7.257,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
553
31/05/2024
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EMPRESA CONTRATADA:				DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO			VALORES DO ADITIVO		
WERCOR CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – ME				ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$	369.390,25	VALOR CONTRATO INICIAL:	R\$	313.777,65
CNPJ: 14.781.255/0001-43				MÊS:	MAIO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:	15,06%		VALOR ACRESCIDO	R\$	78.002,88
CONTRATO: 2023.12.19.1				DATA DA EMISSÃO:	20/05/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	15,06%		VALOR REDUZIDO:	R\$	5.740,51
LICITAÇÃO: 2023.02.07.1				RECURSO:	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:	0,00%		VALOR ADITIVO:	R\$	72.262,37
ORÇAMENTO CONTRATUAL				QUANTIDADES			VALORES (R\$)				
UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
5.1 MURO DE LIMITE EXISTENTE											
5.1.1	0376	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/ PAREDE	79,42 R\$ 7,74 R\$ 6,57	R\$ 521,79		79,42	R\$ 79,42 R\$ 6,57 R\$ 521,79		R\$	R\$ 614,71	R\$ 521,79
5.1.2	0322	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENETRADA, TRAÇO 1:6	159,85 R\$ 49,91 R\$ 42,40	R\$ 6.735,24		159,85	R\$ 159,85 R\$ 42,40 R\$ 6.735,24		R\$	R\$ 7.928,20	R\$ 6.735,24
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
6.1	QUADROS E ACESSÓRIOS										
PADRÃO DE ENTRADA COM QUADRO DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA COM LENTE PARA LEITURA A DISTÂNCIA, QUADRO DE PROTEÇÃO, PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL E DEMAIS ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO											
6.1.1	CPV-H06	UN	1,00 R\$ 1.485,15 R\$ 1.261,63	R\$ 1.261,63		1,00	R\$ 1,00 R\$ 1.261,63 R\$ 1.261,63		R\$	R\$ 1.485,15	R\$ 1.261,63
6.1.2	CPV-H07	UN	1,00 R\$ 456,53 R\$ 387,82	R\$ 387,82		1,00	R\$ 1,00 R\$ 387,82 R\$ 387,82		R\$	R\$ 456,53	R\$ 387,82
6.1.3	CPV-H09	PAR	1,00 R\$ 1,74 R\$ 1,48	R\$ 1,48		1,00	R\$ 1,00 R\$ 1,48 R\$ 1,48		R\$	R\$ 1,74	R\$ 1,48
6.1.4	CPV-H03	PAR	4,00 R\$ 6,82 R\$ 5,81	R\$ 23,24		4,00	R\$ 4,00 R\$ 5,81 R\$ 23,24		R\$	R\$ 27,28	R\$ 23,24
6.1.5	CPV-H02	UN	16,00 R\$ 8,33 R\$ 7,59	R\$ 121,44		16,00	R\$ 16,00 R\$ 7,59 R\$ 121,44		R\$	R\$ 142,88	R\$ 121,44
6.1.6	CPV-H05	UN	14,00 R\$ 8,33 R\$ 7,59	R\$ 106,26		14,00	R\$ 14,00 R\$ 7,59 R\$ 106,26		R\$	R\$ 125,02	R\$ 106,26
6.2 CAIXAS E ACESSÓRIOS											
CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30x30x50 cm, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO COM CANTONEIRAS DE FERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO											
6.2.1	CPV-H08	UN	2,00 R\$ 293,33 R\$ 249,19	R\$ 498,38		2,00	R\$ 2,00 R\$ 249,19 R\$ 498,38		R\$	R\$ 586,66	R\$ 498,38
6.2.2	CPV-H09	UN	10,00 R\$ 437,77 R\$ 371,89	R\$ 3.718,90		10,00	R\$ 10,00 R\$ 371,89 R\$ 3.718,90		R\$	R\$ 4.377,70	R\$ 3.718,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
554
498.38
586,66

1200
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
1º ADT

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE			EMPRESA CONTRATADORA:		DADOS DO ADITIVO		ANÁLISE DO DESCONTO		VALORES DO ADITIVO					
PLANO DE ADITIVO Nº 01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO ENTORNO DA ARENINHA DO BAIRRO DIADEMA. RUA FRANCISCO ONOFRE, S/N, DIADEMA, HORIZONTE - CE			WERCON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA — ME		ADITIVO Nº:	1	VALOR DE REFERÊNCIA DA LICITAÇÃO:	R\$ 369.390,25	VALOR CONTRATO INICIAL:	R\$ 313.772,65				
			CNPJ: 14.781.255/0001-43		MÊS:	MAIO	PERCENTUAL DE DESC. ENTRE O ORÇAM. REFERÊNCIA E O ORÇAM. DA PROPOSTA:	15,06%	VALOR ACRESCIDO:	R\$ 78.002,88				
			CONTRATO: 2023.12.19.1		DATA DA EMISSÃO:	20/05/2024	PERCENTUAL DE DESCONTO POSTERIOR AO 1º ADITIVO	15,06%	VALOR REDUZIDO:	R\$ 5.740,51				
			LICITAÇÃO: 2023.02.07.1		RECURSO:	PMH	DIFERENÇA ENTRE OS DESCONTOS:	0,00%	VALOR ADITIVO:	R\$ 72.262,37				
			ORÇAMENTO CONTRATUAL		VALORES (R\$)		VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO:		R\$ 386.035,02					
ITEM	CÓD.	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. REFERÊNCIA	PREÇO UNIT. CONTRATUAL	PREÇO TOTAL CONTRATUAL	QUANTIDADE ACRESCIDA	QUANTIDADE REDUZIDA	QUANTIDADE ATUALIZADA	VALOR CONTRATUAL ACRESCIDO	VALOR CONTRATUAL REDUZIDO	VALOR REFERÊNCIA ATUALIZADO	VALOR CONTRATUAL ATUALIZADO
6.3		ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS												
6.3.1	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC INC., CONEXÕES D= 25mm (3/4")	M	44,18	R\$ 18,92	R\$ 16,08	R\$ 710,41		44,18		R\$	R\$	R\$ 835,89	R\$ 710,41
6.3.2	C3618	OUTROS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), D=1 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES	M	180,35	R\$ 33,31	R\$ 28,30	R\$ 5.103,91		180,35		R\$	R\$	R\$ 6.007,46	R\$ 5.103,91
6.3.3	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC INC., CONEXÕES D= 60mm (2")	M	3,98	R\$ 50,90	R\$ 43,24	R\$ 172,10		3,98		R\$	R\$	R\$ 202,58	R\$ 172,10
6.4		CABOS, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS												
6.4.1	C0540	CABO ISOLADO PVC 752V 2,5MM2	M	2,50	R\$ 7,68	R\$ 6,54	R\$ 16,35		2,50		R\$	R\$	R\$ 19,20	R\$ 16,35
6.4.2	C0554	CABO EM PVC 1000V 4MM2	M	779,07	R\$ 9,05	R\$ 7,69	R\$ 5.991,05		779,07		R\$	R\$	R\$ 7.050,58	R\$ 5.991,05
6.4.3	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	12,38	R\$ 10,77	R\$ 9,15	R\$ 113,28		12,38		R\$	R\$	R\$ 133,33	R\$ 113,28
6.4.4	C4558	CABO CORDOPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm²	M	102,50	R\$ 10,12	R\$ 8,59	R\$ 880,48		102,50		R\$	R\$	R\$ 1.037,30	R\$ 880,48
6.4.5	C4931	HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8" X 2,40M	UN	13,00	R\$ 128,44	R\$ 109,10	R\$ 1.418,30		13,00		R\$	R\$	R\$ 1.669,72	R\$ 1.418,30
6.4.6	C3911	CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO <C17 10mm BURDY	UN	13,00	R\$ 14,90	R\$ 12,66	R\$ 164,58		13,00		R\$	R\$	R\$ 193,70	R\$ 164,58
6.5		MOVIMENTO DE TERRA												
6.5.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 1,50m	M3	37,25	R\$ 51,60	R\$ 43,84	R\$ 1.633,04		37,25		R\$	R\$	R\$ 1.932,10	R\$ 1.633,04
6.5.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL, S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	37,25	R\$ 33,10	R\$ 28,11	R\$ 1.047,10		37,25		R\$	R\$	R\$ 1.232,98	R\$ 1.047,10
6.6		DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS												
6.6.1	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	UN	11,00	R\$ 26,00	R\$ 22,09	R\$ 242,99		11,00		R\$	R\$	R\$ 142,99	R\$ 242,99
6.6.2	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	UN	1,00	R\$ 106,81	R\$ 90,75	R\$ 90,75		1,00		R\$	R\$	R\$ 106,81	R\$ 90,75
6.6.3	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS S - 40 KA/440V	UN	4,00	R\$ 149,14	R\$ 126,70	R\$ 506,80		4,00		R\$	R\$	R\$ 596,73	R\$ 506,80
6.7		LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS												

PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE-CE
555
1201
506,80
